

Likolahdenkadun rakennusurakka


Hankinnan kohde



- Hankinnan kohteena on Likolahdenkadun saneeraus rakenneosineen ja uuden kevyenliikenteenväylän rakentaminen seuraavalla dialla esitetyllä urakka-alueelle
- Suunniteltu toteutusaika hankinnan kohteena olevalle urakkaosiolle 1 on 26.6.2023 - 30.11.2023

Likolahdenkadun rakennusurakka

Hankinnan kohteen urakka-alue

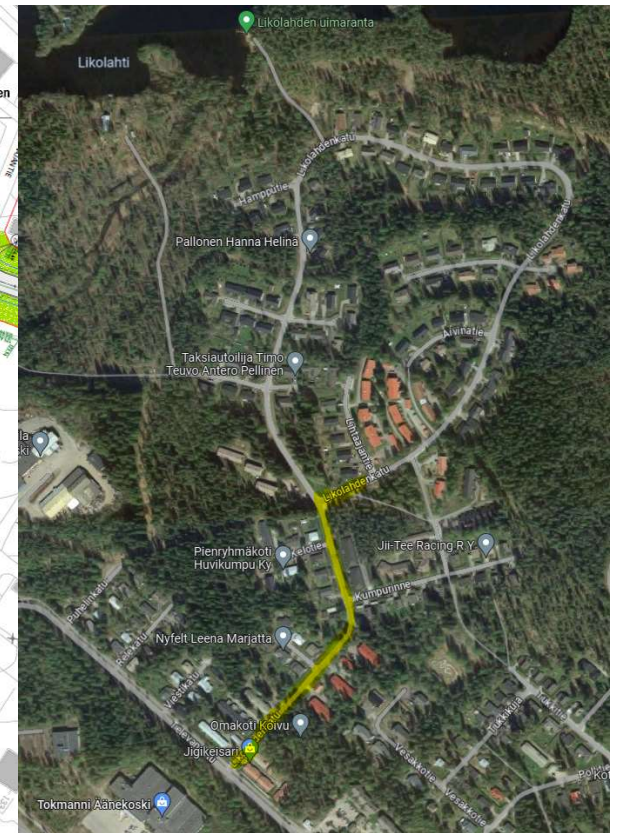

1.6.2023

Likolahdenkadun rakennusurakka Hankintamenettely



- Tarjouksia on pyydetty rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon ylittävällä, mutta EU-kynnysarvon alittavalla avoimella hankintamenettelyllä.
- Tarjouspyyntö on lähetetty julkaistavaksi 3.5.2023 ja tarjouksia on voinut jättää 23.5.2023 klo 10:00 saakka.
- Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka arviointikriteerinä on halvin hinta.

Likolahdenkadun rakennusurakka

Tarjousten käsittely

- Kilpailuun saapui 2 tarjousta (Destia Oy ja Kosken Levytyö Oy).
 - Molemmat tarjoajat täyttävät soveltuvuusvaatimukset
 - Molemmat tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia
 - Tarjoushinnat:
 1. Kosken Levytyö Oy 469 200 €
 2. Destia Oy 516 200 €
- Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Kosken Levytyö Oy.
 - Tarjoushinta ylittää hankeosiolle varatun kustannusarvion, mutta ei koko erillishankkeen sitovaa kustannusarviota.

Likolahdenkadun rakennusurakka

Hankkeen kustannusarvio

- Suunnitelma-asiakirjojen mukainen kustannusarvio: n. 1 201 000 € + urakoitsijavelvoitteiden kustannukset
 - Talousarviossa sitovaksi hyväksytty hankkeen kustannusarvio 820 000 €, josta:
 - 2023: 420 000 € (suunnittelijan kustannusarvio 356 000 € + urakoitsijavelvoitteet)
 - 2024: 350 000 € (suunnittelijan kustannusarvio 845 000 € + urakoitsijavelvoitteet)
- Suunnitelmien mukainen toteutus edellyttää sitovan kustannusarvion muutosta ja/tai 2024 toteutusosan supistamista
- Mikäli 2024 toteutusosan suunnitelmia muokataan olennaisesti suppeammiksi, voidaan tarjous hyväksyä ilman, että hankkeen sitova kustannusarvio ylittyy.
- Mikäli toteutusosan 2024 suunnitelmia ei olennaisesti supisteta, tulee sitovaa kustannusarviota muuttaa. Pelkästään urakkaosion 1 aiheuttama kustannusarvion ylitys on teknisen johtajan päätettävissä, mutta suunnitelmien mukaiselle urakkaosiolle 2 ennakoitavissa oleva sitovan kustannusarvion ylitys edellyttää valtuuston hyväksyntää

Likolahdenkadun rakennusurakka

Kysymykset ja keskustelu



- Kysymyksiä?

1.6.2023
